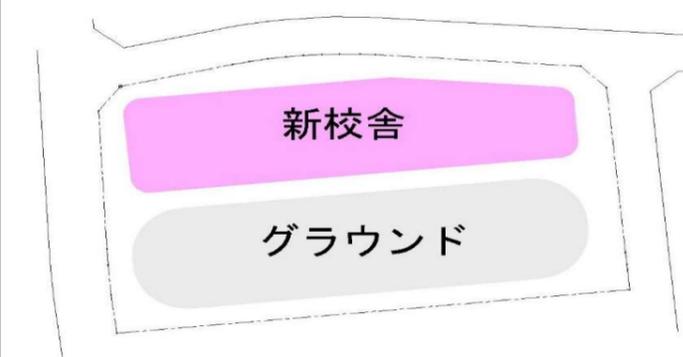
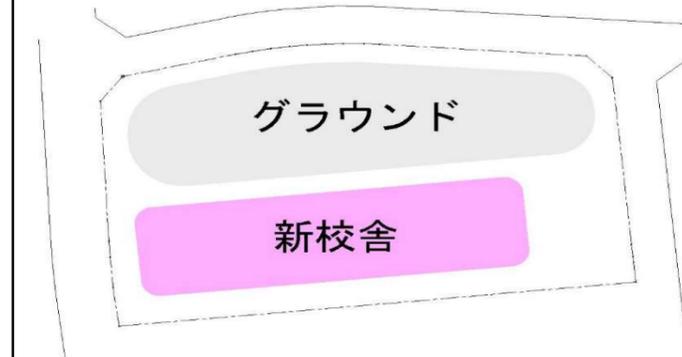


校舎配置計画比較検討（案）

◎：優れている ○：やや優れている △：普通 ×：劣っている

		A案	B案	C案				
校舎配置イメージ		 <p>既存校舎西側の一部(蜂の巣校舎)を解体するため、機能移転をすることから、校庭に一部仮設校舎を設置する。その後、新校舎を建設する。 仮設校舎建設→引越し→校舎一部解体→新校舎建設</p>	 <p>現校庭部分に大規模な仮設校舎を建設する。その後、既存校舎を解体し、新校舎を建設する。 仮設校舎建設→引越し→全校舎解体→新校舎解体</p>	 <p>現校庭部分に新校舎を建設する。その後、既存校舎を解体する。 (仮設校舎は不要)</p>				
特徴	工事中	騒音・振動・粉塵	他案に比べ比較的小さい	△	他案に比べ最大	×	他案に比べ仮設校舎の解体が無い	×
		グラウンド利用	利用できない ×					
		体育館利用	利用できる ◎					
	工事期間	B案に比べ若干短い(想定42ヶ月)	△	他案に比べ最長(想定45ヶ月)	△	他案に比べ最短(想定36ヶ月)	○	
	整備後	グラウンドの使い勝手	160mトラック (トラックのカーブが他案に比べ最も緩やか)	○	170mトラック (トラックのカーブが急)	△	・170mトラック (トラックのカーブが急) ・校舎の日影の影響あり	×
		教室・給食配膳動線	メイン動線が南北方向のため、動線距離が比較的短い	◎	メイン動線が東西方向のため、動線距離が長い	△	メイン動線が東西方向のため、動線距離が長い	△
	その他	近隣への影響(日影)	東西方向は短いやや影響あり	○	他案に比べ最大	×	校舎南配置のため影響なし	◎
		仮設校舎の必要性	一部(ハチの巣の部分)	△	全校舎	×	無い	◎
		引越し回数	2回(一部引越し)	△	2回(全校)	×	1回	○
		事業費	一部仮設校舎の建設費用及び引越し費用が増 C案に比べ、長期の工期になることによる経費の増	△	全機能の仮設校舎の建設費用及び引越し費用が増 他案に比べ、最長工期になることによる経費の増	×	仮設校舎の建設及び引越しがなく、工期も最短	○
