

令和7年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和7年7月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立国領小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28, 481, 200 円	R6.7.12	(株)磯原電気	0%	0%	
				R6.7.16 ～ R7.9.30				
2	調布市立柏野小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28, 080, 800 円	R6.7.17	深電工業(株)	0%	0%	
				R6.7.18 ～ R7.9.25				
3	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う先行工事	給食室改修に伴う先行工事	24, 475, 000 円	R7.4.22	宮沢設備工業(株)	25%	3%	参考写真 No.1
				R7.4.23 ～ R7.9.30				
4	調布市立柏野小学校体育館内部改修工事	体育館内部改修工事	116, 050, 000 円	R7.5.14	(株)川又工務店	7%	0%	参考写真 No.2
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
5	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事	体育館内部改修に伴う電気設備工事	41, 384, 200 円	R7.5.14	園部電設(株)	5%	0%	
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
6	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事	体育館内部改修に伴う機械設備工事	10, 890, 000 円	R7.5.14	宮沢設備工業(株)	5%	0%	
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
7	調布市立富士見台小学校給食室改修工事	給食室改修工事	115, 016, 000 円	R7.6.2	(株)貴建築工房	0%	0%	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
8	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	25, 261, 500 円	R7.6.2	深電工業(株)	0%	0%	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
9	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	168, 850, 000 円	R7.6.2	宮沢設備工業(株)	2%	0%	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立多摩川小学校給食室改修工事	給食室改修工事	167, 200, 000 円	R7.6.2	林建設(株)	2%	0%	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
11	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	26, 104, 100 円	R7.6.2	いわき電工(株)本店	0%	0%	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
12	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	162, 580, 000 円	R7.6.2	(株)あかつき設備	0%	0%	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
13	調布市立第七中学校校庭整備工事	校庭整備工事	60, 830, 000 円	R7.6.16	(株)井上グラウンド施設工事	2%	—	参考写真 No.3
				R7.6.17 ～ R7.10.31				
14	調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事	校舎外部改修工事	31, 680, 000 円	R7.6.23	(株)久保工務店	0%	—	
				R7.6.24 ～ R7.12.12				
15	調布市立多摩川小学校給水直結化工事	給水直結化工事	29, 150, 000 円	R7.6.23	(株)あかつき設備	0%	—	
				R7.6.24 ～ R7.10.31				



No.1

調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う先行工事


屋上空調室外機基礎 施工状況



No.2

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

アリーナ床 撤去状況

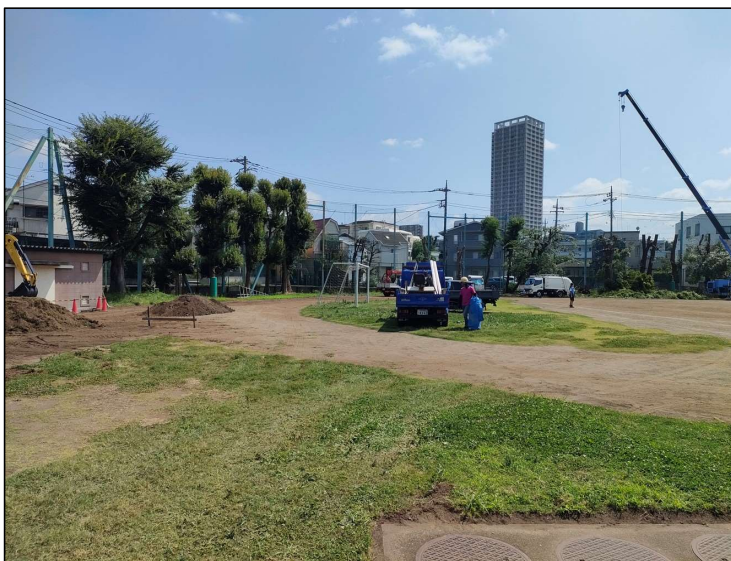

No.3

調布市立第七中学校校庭整備工事

既存樹木剪定及びU字溝設置 施工状況
