


令和7年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和7年9月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立国領小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28, 481, 200 円	R6.7.12	(株)磯原電気	98%	5%	
				R6.7.16 ～ R7.9.30				
2	調布市立柏野小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28, 080, 800 円	R6.7.17	深電工業(株)	3%	3%	
				R6.7.18 ～ R7.9.25				
3	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う先行工事	給食室改修に伴う先行工事	24, 475, 000 円	R7.4.22	宮沢設備工業(株)	90%	70%	
				R7.4.23 ～ R7.9.30				
4	調布市立柏野小学校体育館内部改修工事	体育館内部改修工事	116, 050, 000 円	R7.5.14	(株)川又工務店	35%	15%	参考写真 No.1
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
5	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事	体育館内部改修に伴う電気設備工事	41, 384, 200 円	R7.5.14	園部電設(株)	25%	10%	
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
6	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事	体育館内部改修に伴う機械設備工事	10, 890, 000 円	R7.5.14	宮沢設備工業(株)	25%	10%	
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
7	調布市立富士見台小学校給食室改修工事	給食室改修工事	115, 016, 000 円	R7.6.2	(株)貴建築工房	17%	10%	参考写真 No.2
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
8	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	25, 261, 500 円	R7.6.2	深電工業(株)	20%	5%	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
9	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	168, 850, 000 円	R7.6.2	宮沢設備工業(株)	30%	10%	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立多摩川小学校給食室改修工事	給食室改修工事	167, 200, 000 円	R7.6.2	林建設(株)	25%	8%	参考写真 No.3
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
11	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	26, 104, 100 円	R7.6.2	いわき電工(株)本店	8%	5%	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
12	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	162, 580, 000 円	R7.6.2	(株)あかつき設備	10%	5%	
				R7.6.3 ～ R8.3.31				
13	調布市立第七中学校校庭整備工事	校庭整備工事	60, 830, 000 円	R7.6.16	(株)井上グラント施設工事	60%	30%	参考写真 No.4
				R7.6.17 ～ R7.10.31				
14	調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事	校舎外部改修工事	31, 680, 000 円	R7.6.23	(株)久保工務店	10%	3%	参考写真 No.5
				R7.6.24 ～ R7.12.12				
15	調布市立多摩川小学校給水直結化工事	給水直結化工事	29, 150, 000 円	R7.6.23	(株)あかつき設備	50%	5%	
				R7.6.24 ～ R7.10.31				
16	調布市立深大寺小学校普通教室空調機更新工事	空調機の更新工事	21, 890, 000 円	R7.7.17	木村設備(株)	90%	15%	参考写真 No.6
				R7.7.18 ～ R7.9.30				
17	調布市立緑ヶ丘小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	10, 089, 200 円	R7.8.22	園部電設(株)	0%	—	
				R7.8.25 ～ R8.1.30				
18	調布市立八雲台小学校西側フェンス改修工事	フェンス改修工事	33, 300, 000 円	R7.9.3	(有)日本ハウジング	0%	—	
				R7.9.4 ～ R8.2.27				

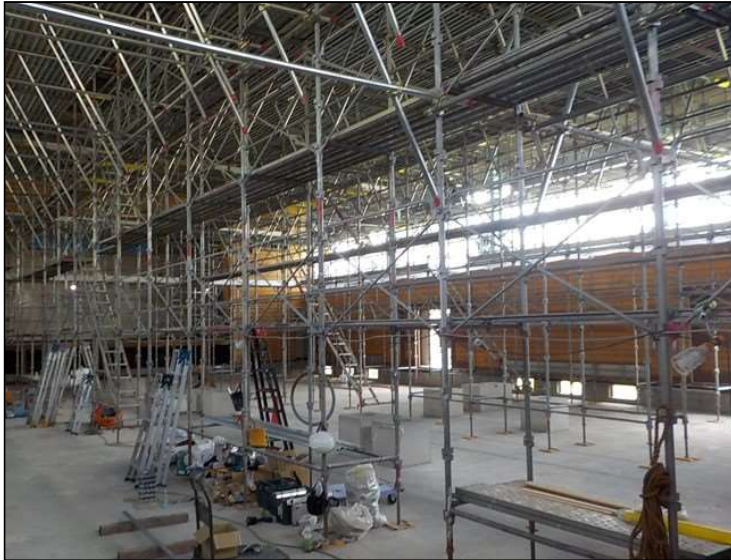

No.1
調布市立柏野小学校体育館内部改修工事
内部仮設足場 設置状況




No.2
調布市立富士見台小学校給食室改修工事
給食室内部撤去 施工状況



No.3
調布市立多摩川小学校給食室改修工事
給食室増築部基礎 施工状況



No.4
調布市立第七中学校校庭整備工事
校庭内 施工状況

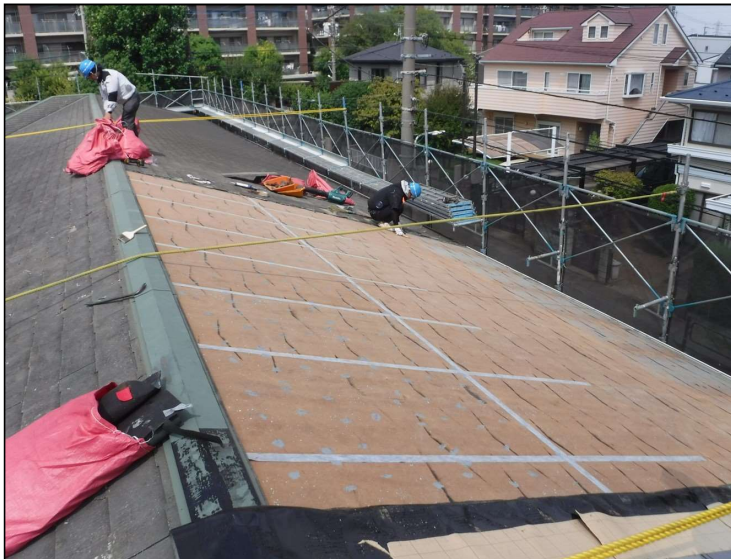

No.5
調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事
屋根改修 施工状況



No.6
調布市立深大寺小学校普通教室空調機更新工事
空調室外機 設置状況
