

令和7年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和8年2月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館施設整備PFI事業	校舎・図書館の新築工事	12,980,615,450円 内 建設工事 10,495,763,300円	R6.9.25	PFI調布小・中学校・図書館施設整備(株)	4%	2%	参考写真 No.1
				R6.9.26 ～ R24.3.31 (建設工事 R11.1.31)				
2	調布市立柏野小学校体育館内部改修工事	体育館内部改修工事	116,050,000円	R7.5.14	(株)川又工務店	100%	99%	完了検査 1月22日
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
3	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事	体育館内部改修に伴う電気設備工事	41,384,200円	R7.5.14	園部電設(株)	100%	85%	完了検査 1月22日
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
4	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事	体育館内部改修に伴う機械設備工事	10,890,000円	R7.5.14	宮沢設備工業(株)	100%	85%	完了検査 1月22日
				R7.5.15 ～ R8.1.23				
5	調布市立富士見台小学校給食室改修工事	給食室改修工事	115,016,000円	R7.6.2	(株)貴建築工房	85%	68%	参考写真 No.2
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
6	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	25,261,500円	R7.6.2	深電工業(株)	75%	45%	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
7	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	168,850,000円	R7.6.2	宮沢設備工業(株)	70%	50%	
				R7.6.3 ～ R8.3.23				
8	調布市立多摩川小学校給食室改修工事	給食室改修工事	167,200,000円	R7.6.2	林建設(株)	59%	52%	参考写真 No.3
				R7.6.3 ～ R8.3.31				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
9	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	26,104,100円	R7.6.2	いわき電工(株)本店	55%	40%	
				R7.6.3				
				R8.3.31				
10	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	162,580,000円	R7.6.2	(株)あかつき設備	38%	35%	
				R7.6.3				
				R8.3.31				
11	調布市立緑ヶ丘小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	10,089,200円	R7.8.22	園部電設(株)	100%	99%	完了検査 2月10日
				R7.8.25				
				R8.1.30				
12	調布市立八雲台小学校西側フェンス改修工事	フェンス改修工事	33,300,000円	R7.9.3	(有)日本ハウジング	85%	80%	完了検査 2月20日 予定
				R7.9.4				
				R8.2.27				
13	調布市立調和小学校プール可動床更新工事	プール可動床更新工事	64,601,768円	R7.9.16	(株)G-BANK	80%	15%	参考写真 No.4
				R7.9.17				
				R8.3.18				
14	調布市立北ノ台小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	11,880,000円	R7.9.25	小林電気(株)	90%	0%	完了検査 2月27日 予定
				R7.9.26				
				R8.2.27				
15	調布市立調布中学校空調設備更新工事	空調設備更新工事	24,750,000円	R7.10.14	宮沢設備工業(株)	99%	50%	完了検査 2月12日 予定
				R7.10.15				
				R8.3.16				
16	調布市立第五中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	22,825,000円	R7.10.23	三盛電設(株)	75%	70%	
				R7.10.24				
				R8.3.16				
17	調布市立国領小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	25,482,380円	R7.11.11	(株)三誠	20%	10%	
				R7.11.12				
				R8.3.13				
18	調布市立第三小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	22,165,000円	R7.11.11	いわき電工(株)本店	8%	5%	
				R7.11.12				
				R8.3.16				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
19	調布市立滝坂小学校ほか1校空調設備改修工事	空調設備改修工事 (石原小学校)	19,690,000円	R7.11.20	木村設備㈱	99%	90%	完了検査 2月19日 予定
				R7.11.21 ～ R8.3.11				
20	調布市立上ノ原小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	27,390,000円	R7.12.2	㈱大東電設	10%	5%	
				R7.12.3 ～ R8.3.27				
21	調布市立柏野小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	20,300,500円	R7.12.2	園部電設㈱	0%	0%	
				R7.12.3 ～ R8.3.27				
22	調布市立北ノ台小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	21,560,000円	R7.12.2	㈱葉月商会	0%	0%	
				R7.12.3 ～ R8.3.27				
23	調布市立第一小学校プール改修工事	プール水槽改修工事	17,750,700円	R7.12.4	㈱ビルディングドクター	20%	2%	
				R7.12.5 ～ R8.3.31				
24	調布市立図書館深大寺分館空調設備改修工事	空調設備改修工事	22,550,000円	R7.11.13	平井設備㈱	80%	0%	
				R7.11.14 ～ R8.3.13				
25	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事	遺跡ガイダンス施設の新築工事	323,400,000円	R7.12.18	相互建設㈱	5%	0%	参考写真 No.5
				R7.12.19 ～ R8.12.11				
26	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築に伴う電気設備工事	遺跡ガイダンス施設の新築に伴う電気設備工事	44,968,000円	R7.12.18	㈱磯原電気	0%	0%	
				R7.12.19 ～ R8.12.11				
27	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築に伴う機械設備工事	遺跡ガイダンス施設の新築に伴う機械設備工事	53,625,000円	R7.12.18	宮沢設備工業㈱	1%	0%	
				R7.12.19 ～ R8.12.11				


No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
29	調布市立図書館宮の下分館改築工事	図書館分館の改築工事	301,400,000円	R7.12.18	林建設(株)	3%	0%	参考写真 No.6
				R7.12.19 ～ R9.1.8				
30	調布市立図書館宮の下分館改築に伴う電気設備工事	図書館分館の改築に伴う電気設備工事	58,448,500円	R7.12.18	(株)磯原電気	0%	0%	
				R7.12.19 ～ R9.1.8				
31	調布市立図書館宮の下分館改築に伴う機械設備工事	図書館分館の改築に伴う機械設備工事	40,497,600円	R7.12.18	(株)あかつき設備	0%	0%	
				R7.12.19 ～ R9.1.8				



No.1
調布市立若葉小学校・第四中学校・
図書館若葉分館施設整備PFI事業
基礎 施工状況



No.2
調布市立富士見台小学校給食室改修工事
内部仕上 施工状況

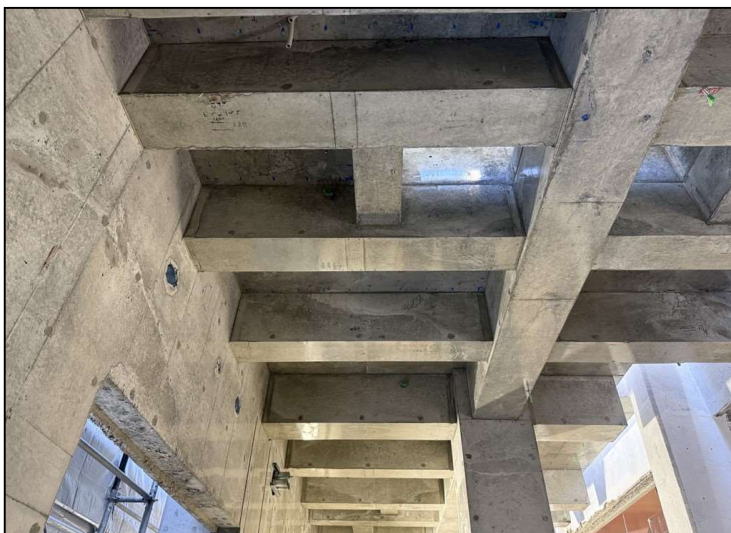

No.3
調布市立多摩川小学校給食室改修工事
増築棟躯体 施工状況



No.4
調布市立調和小学校プール可動床更新工事
可動床・床パネル 施工状況



No.5
（仮称）調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事
山留 施工状況



No.6
調布市立図書館宮の下分館改築工事
柱状改良 施工状況
