



調布駅前広場の 整備状況・今後の予定

調布市 都市整備部まちづくり推進課

令和7年 7月

調布駅前広場の整備について

■ はじめに

調布駅前広場は、今年度末の完成に向けて、現在、整備を進めています。

今年度は、調布駅前広場全体の整備工事及び広場口建替工事を行っています。

当パネルは、調布駅前広場の今後の予定等を情報提供するために展示しています。

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

■ 現在実施している工事

① 調布駅前広場整備工事

◆工事内容：南側ロータリー、東側の側道の整備
歩行空間の整備(舗装, 樹木, ベンチ等の設置)

◆工 期：令和5年7月～令和8年3月

◆施工業者：林・調和建設共同企業体

◆作 業 日：月曜～土曜日

◆作業時間：21:00～6:00(夜間施工)(一部昼間施工)

② 調布駅広場口建替工事

◆工事内容：調布駅広場口の上家部分の建替え

◆工 期：令和6年8月～令和7年10月

◆施工業者：京王建設株式会社

◆作 業 日：月曜～金曜日

◆作業時間：23:00～6:00(夜間施工)(一部昼間施工)

■ 工事に関するお問合せ先

調布市 都市整備部 まちづくり推進課 整備係
電話：042-481-7417(直通)

■ 自転車通行に関するお問合せ先

調布市 都市整備部 交通対策課 交通対策係
電話：042-481-7454(直通)

今後の工事の流れ

令和7年7～10月 広場口建替工事完了まで



- ・ 10月末まで調布駅広場口の建替工事を行います。
- ・ 広場南東側の歩道築造工事と広場内の施設（ベンチ等）の設置を行います。

令和7年11～1月 広場口建替工事完了後



- ・ 調布駅広場口の建替工事完了後、北側ロータリー上屋の一部改修工事を行います。
- ・ 広場口周辺の歩道舗装と南東側側道部の車道舗装を行います。

令和8年2～3月 整備完了（一部除く）





- ・ 車道部の仕上げ工事を行います。

※工事は原則夜間施行（21：00～6：00）で行います。

調布駅広場口建替工事について

■ 工事期間中の規制(予定)

- ・ 令和7年9月中旬頃、広場口階段部分の仮囲いを撤去します。(工事規制前の階段幅 約3m に戻ります。)
- ・ 広場口のエレベーターは、9月中に使用開始(予定)となります。
- ・ 広場口のエスカレーターは、改修を行うため、使用開始は令和7年度末頃(令和8年3月)の予定です。
(中央口・東口のエスカレーター・エレベーターは使用可能です。)
- ・ 広場口の工事完了後、北側ロータリー上屋の一部工事を行います。
- ・ 北側ロータリー上屋の一部工事完了後、バス停を元の位置に戻します。

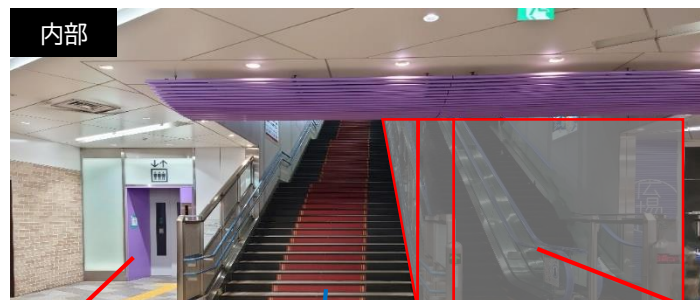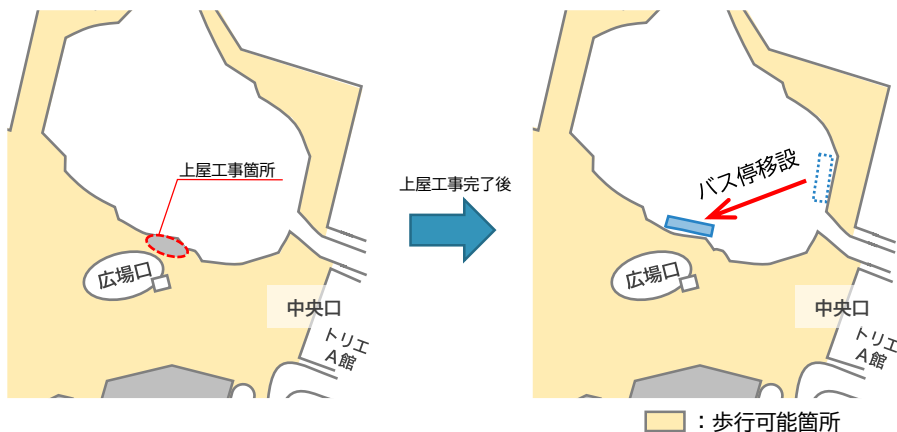


エレベーター
使用開始
9月中(予定)

9月中旬頃
階段の規制解除

エスカレーター
使用開始
令和7年度末(予定)

■ 歩行空間の確保について


- ・ 人工地盤(下図の青色部)を設置
- ・ 北側ロータリーとの間の歩行者空間が広がります。
(現状3.8m⇒約6.1m)

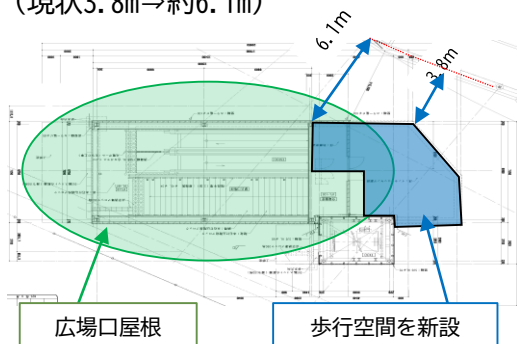

▲建替前の広場口

■ 北側上屋の一部工事について

- ・ 広場口の工事完了に伴い、北側ロータリー上屋の切欠きになっている部分のパネルを交換する工事を行います。

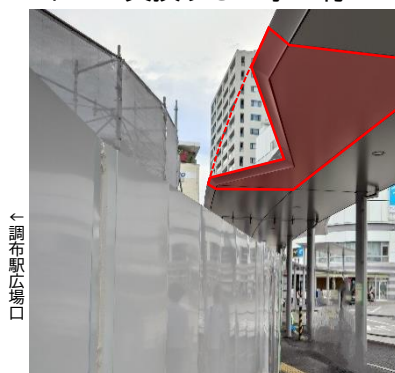


ロータリー上屋の
パネル交換箇所

調布駅広場口完成イメージ

前 面(西側)




正 面

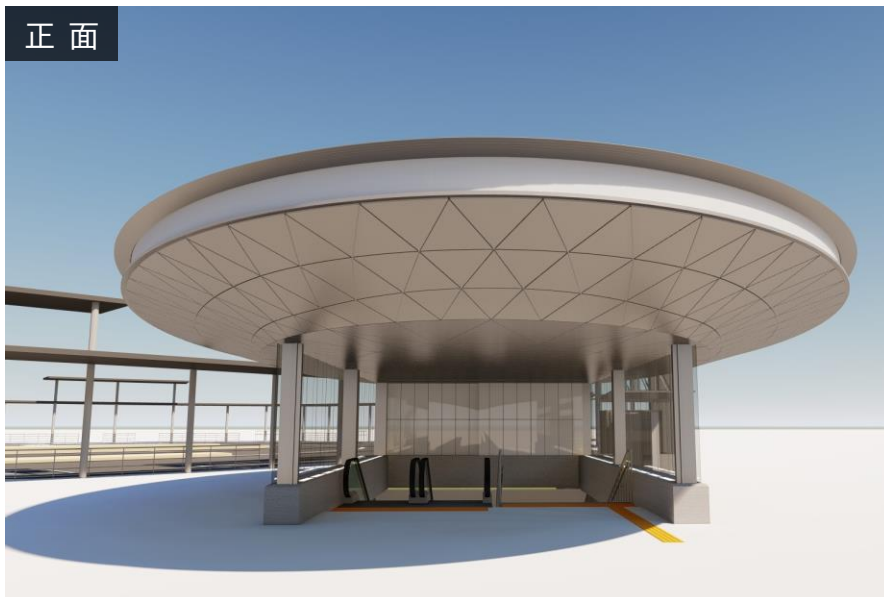

背 面(東側)




夜 間

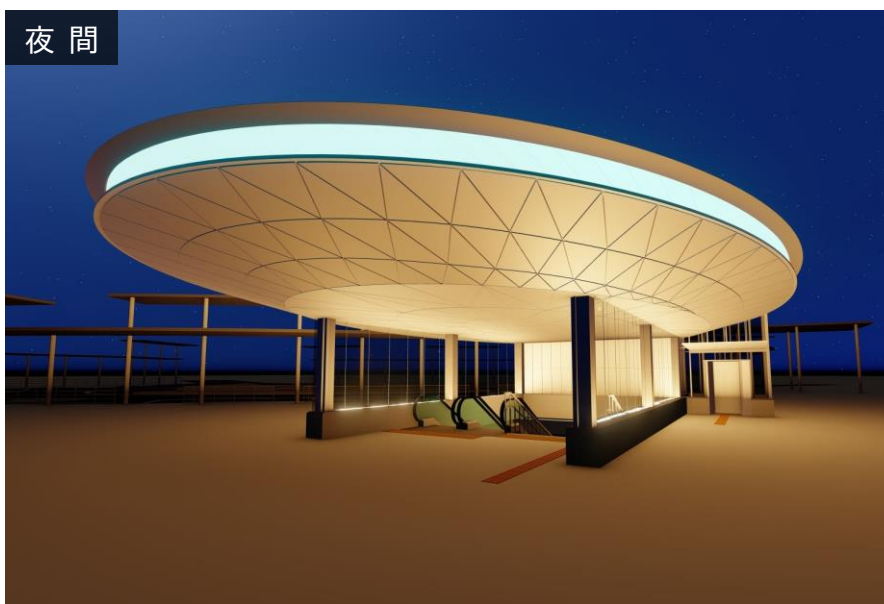

樹木について

- ・調布駅前広場の植栽については、令和3年3月に『調布駅前広場整備計画図』で決定しています。
- ・工事の進捗に合わせて、樹木を配置しています。

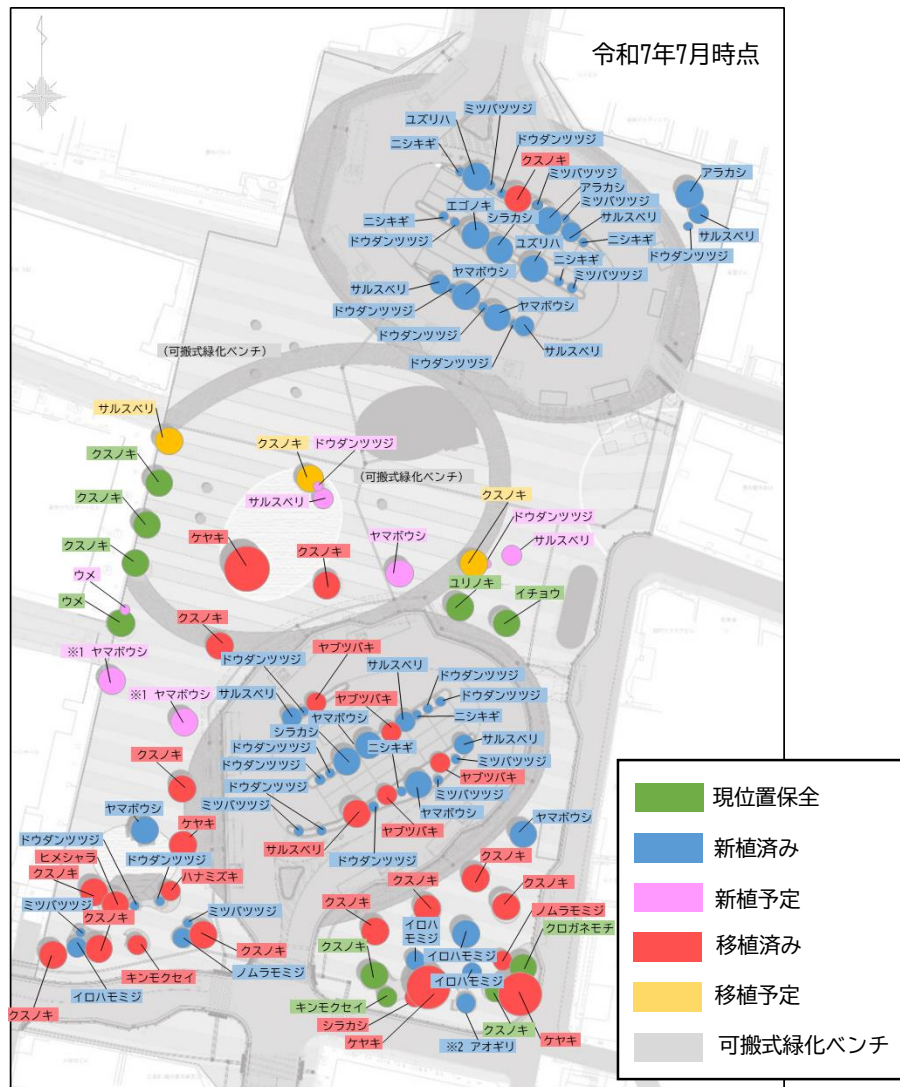

各種施設について

- ・今年度末の調布駅前広場完成に向け、各種施設の工事を進めています。

ベンチ

広場利用者が通年快適に利用できるよう、樹木の周りに木製ベンチを設置しています。



設置状況

デジタルサイネージ

広場口背面にデジタルサイネージを設置し、地域情報等を発信します。



設置イメージ

スマートバス停

デジタルサイネージによるバス停と総合交通案内板を設置し、わかりやすい情報発信を行います。



設置イメージ

ミスト

うるおい空間の創出と効果的な暑さ対策を講じられるよう、広場の適所にミストを設置します。
今年度は新たに南東側の樹木ベンチに設置します。




設置イメージ

調布駅周辺道路の整備について

調布駅周辺の道路ネットワークと歩行者回遊軸の形成に向けて、駅前広場の整備と併せて周辺道路の整備を進めています。

調布駅周辺の道路箇所図

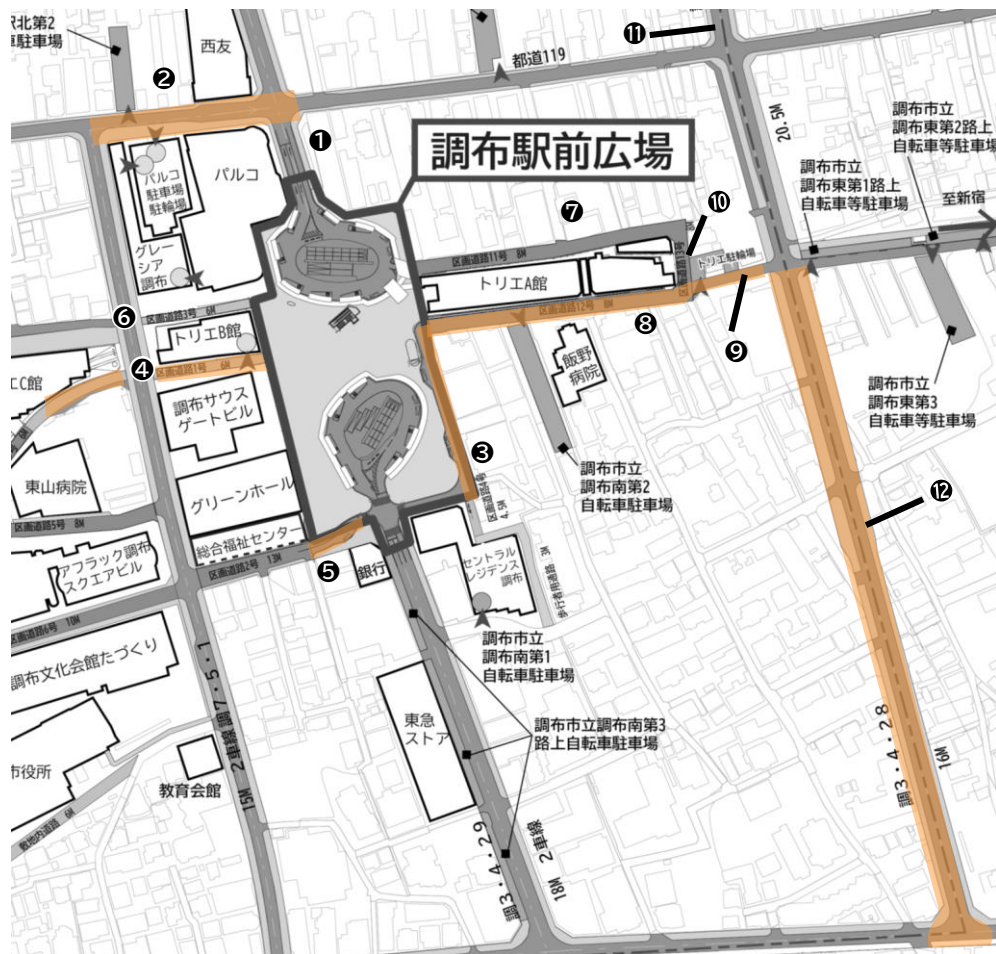

調布駅周辺の道路整備スケジュール

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
① 調布3・4・30号線 (調布駅前広場～旧甲州街道)	詳細設計	工事			
② 調布7・5・1号線	協議	詳細設計	企業者調整	企業者工事	工事
③ 調布駅前広場東側側道	詳細設計	企業者工事	工事		
④ 区画道路1号・9号				詳細設計	工事
⑤ 区画道路2号	予備設計		詳細設計	工事	
⑥ 区画道路3号		詳細設計	工事		
⑦ 区画道路11号		詳細設計	工事		
⑧ 区画道路12号		予備設計		詳細設計	工事
⑨ 市道S74号線 (区画道路13号～調布3・4・28号線)		詳細設計		修正設計	工事
⑩ 区画道路13号		詳細設計	工事		
⑪ 調布3・4・28号線 (旧甲州街道～甲州街道)	電線共同溝工事 道路詳細設計	道路工事			
⑫ 調布3・4・28号線 (品川通り～京王線)			企業者工事		
	電線共同溝設計		電線共同溝工事		
		道路詳細設計			
					暫定開放 道路工事 (令和8年度まで)

・京王線～旧甲州街道
⇒相互通行可
・旧甲州街道との交差点
⇒信号設置

調布駅前広場の自転車通行について

自転車は「押し歩き」していただくよう周知する取組を行っています。

※調布駅前広場の歩行空間は、道路交通法上の「歩道」に位置付けられており、「軽車両」である自転車は**通行できず、押し歩きになります**。例外として、運転者が13歳未満や70歳以上の高齢者や身体の不自由な人の場合、車道又は交通の状況から見て止むを得ない場合などは、徐行が認められていますが、その際も「歩行者が優先」です。

取組内容

引き続き行います

- ・自転車の迂回案内看板・「自転車押し歩き」サインスタンドを配置
- ・声掛けや音声案内装置による呼びかけの実施
- ・警察とも連携し、歩行者の安全を損なう自転車の乗り入れを制限



声掛けの様子



自転車安全利用キャンペーンなどの普及啓発活動（調布警察署・市 他）



押し歩き声掛け配置図

配置箇所：◆

自転車のルールについて

- ・令和8年4月1日の改正道路交通法（令和6年5月24日公布）施行により、自転車等に交通反則通告制度が適用され、反則行為に対し、反則金の納付通告を受ける場合があります。
