

令和7年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和7年10月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立国領小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28,481,200 円	R6.7.12 R6.7.16 ～ R7.9.30	(株)磯原電気	100%	98%	完了検査 10月6日 参考写真 No.1
2	調布市立柏野小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28,080,800 円	R6.7.17 R6.7.18 ～ R7.12.19	深電工業(株)	3%	3%	*1
3	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う先行工事	給食室改修に伴う先行工事	24,475,000 円	R7.4.22 R7.4.23 ～ R7.9.30	宮沢設備工業(株)	100%	90%	完了検査 10月7日
4	調布市立柏野小学校体育館内部改修工事	体育館内部改修工事	116,050,000 円	R7.5.14 R7.5.15 ～ R8.1.23	(株)川又工務店	50%	35%	参考写真 No.2
5	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事	体育館内部改修に伴う電気設備工事	41,384,200 円	R7.5.14 R7.5.15 ～ R8.1.23	園部電設(株)	35%	25%	
6	調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事	体育館内部改修に伴う機械設備工事	10,890,000 円	R7.5.14 R7.5.15 ～ R8.1.23	宮沢設備工業(株)	40%	25%	
7	調布市立富士見台小学校給食室改修工事	給食室改修工事	115,016,000 円	R7.6.2 R7.6.3 ～ R8.3.23	(株)貴建築工房	27%	17%	参考写真 No.3
8	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	25,261,500 円	R7.6.2 R7.6.3 ～ R8.3.23	深電工業(株)	25%	20%	
9	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	168,850,000 円	R7.6.2 R7.6.3 ～ R8.3.23	宮沢設備工業(株)	35%	30%	

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立多摩川小学校給食室改修工事	給食室改修工事	167, 200, 000 円	R7.6.2	林建設(株)	32%	25%	参考写真 No.4
				R7.6.3 ~ R8.3.31				
11	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	26, 104, 100 円	R7.6.2	いわき電工(株)本店	12%	8%	
				R7.6.3 ~ R8.3.31				
12	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	162, 580, 000 円	R7.6.2	(株)あかつき設備	20%	10%	
				R7.6.3 ~ R8.3.31				
13	調布市立第七中学校校庭整備工事	校庭整備工事	60, 830, 000 円	R7.6.16	(株)井上グラウンド施設工事	90%	60%	完了検査 10月23日 予定 参考写真 No.5
				R7.6.17 ~ R7.10.31				
14	調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事	校舎外部改修工事	31, 680, 000 円	R7.6.23	(株)久保工務店	20%	10%	参考写真 No.6
				R7.6.24 ~ R7.12.12				
15	調布市立多摩川小学校給水直結化工事	給水直結化工事	29, 150, 000 円	R7.6.23	(株)あかつき設備	80%	50%	
				R7.6.24 ~ R7.10.31				
16	調布市立深大寺小学校普通教室空調機更新工事	空調機の更新工事	21, 890, 000 円	R7.7.17	木村設備(株)	100%	90%	完了検査 10月8日
				R7.7.18 ~ R7.9.30				
17	調布市立緑ヶ丘小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	10, 089, 200 円	R7.8.22	園部電設(株)	0%	0%	
				R7.8.25 ~ R8.1.30				
18	調布市立八雲台小学校西側フェンス改修工事	フェンス改修工事	33, 300, 000 円	R7.9.3	(有)日本ハウジング	0%	0%	
				R7.9.4 ~ R8.2.27				
19	調布市立調和小学校プール可動床更新工事	プール可動床更新工事	64, 601, 768 円	R7.9.16	(株)G-BANK	0%	—	
				R7.9.17 ~ R8.3.18				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
20	調布市立北ノ台小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	11, 880, 000 円	R7.9.25	小林電気(株)	0%	—	
				R7.9.26				
				～ R8.2.27				

注 記

＊1 契約変更(R7.9.24 締結)

変更内容：工期の延伸

(変更前) 令和7年9月25日 ⇒ (変更後) 令和7年12月19日

理由：新設した受変電設備への切替作業を夏休み期間中に実施する予定であったが、電力の供給元である東京電力(株)との作業実施日の調整がつかず、当初予定していた工事期間での工事完了が見込めなくなったため。



No.1

調布市立国領小学校受変電設備改修工事


受変電設備 施工完了



No.2

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

内部塗装改修 施工状況

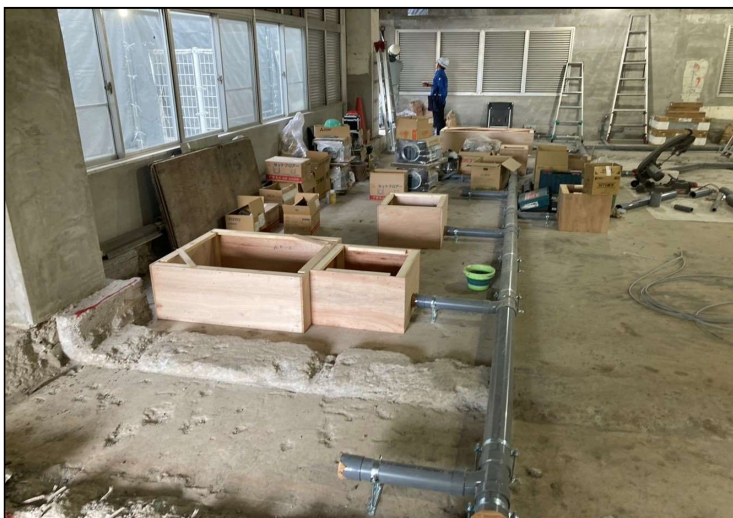

No.3

調布市立富士見台小学校給食室改修工事


給食室内部配管 施工状況



No.4
調布市立多摩川小学校給食室改修工事
給食室内部配管 施工状況



No.5
調布市立第七中学校校庭整備工事
校庭内 施工状況

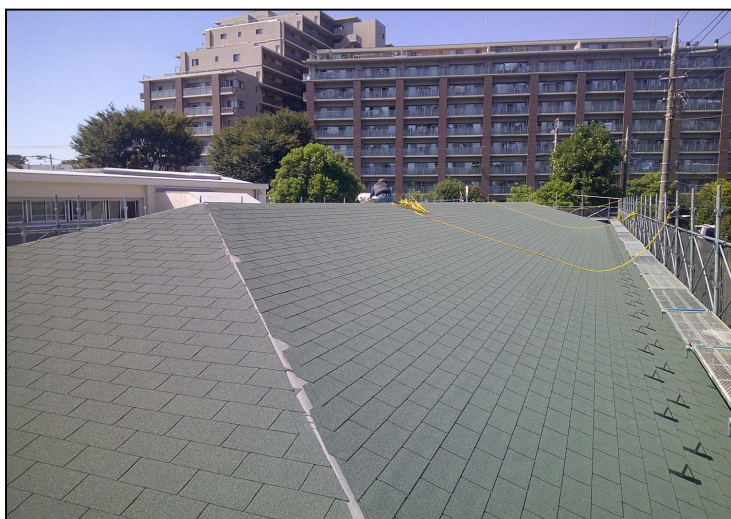

No.6
調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事
屋根改修 施工状況
