

令和8年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和8年8月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館施設整備PFI事業	校舎・図書館の新築工事	12,980,615,450 円 内 建設工事 10,495,763,300 円	R6.9.25	PFI調布小・中学校・図書館施設整備(株)	14%	12%	参考写真 No.1
				R6.9.26 ～ R24.3.31 (建設工事 R11.1.31)				
2	調布市立第三中学校防災盤ほか改修工事	防災盤等更新工事	15,576,000 円	R8.5.19	(株)葉月商会	40%	0%	
				R8.5.20 ～ R8.10.30				
3	調布市立飛田給小学校体育館内部改修工事	体育館内部改修工事及び機械設備工事	96,679,000 円	R8.5.20	(株)ライフスタイル	15%	5%	参考写真 No.2
				R8.5.21 ～ R9.1.22				
4	調布市立飛田給小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事	体育館内部改修に伴う電気設備工事	48,224,000 円	R8.5.20	三盛電設(株)	5%	1%	
				R8.5.21 ～ R9.1.22				
5	調布市立調布中学校体育館外部改修工事	体育館外部改修工事	94,490,000 円	R8.5.22	(株)川又工務店	12%	3%	参考写真 No.3
				R8.5.25 ～ R9.2.26				
6	調布市立杉森小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	23,749,000 円	R8.5.25	深電工業(株)	0%	0%	
				R8.5.26 ～ R9.2.26				
7	調布市立第五中学校普通教室空調機更新工事	空調機更新工事	54,120,000 円	R8.5.29	東和空調(株)	30%	1%	
				R8.6.1 ～ R8.10.19				
8	調布市立第二小学校給食室改修工事	給食室改修工事	149,490,000 円	R8.6.2	(株)貴建築工房	7%	3%	参考写真 No.4
				R8.6.3 ～ R9.3.23				
9	調布市立第二小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	27,335,000 円	R8.6.2	深電工業(株)	6%	3%	
				R8.6.3 ～ R9.3.23				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立第二小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	176,000,000円	R8.6.2	宮沢設備工業(株)	6%	5%	
				R8.6.3 ～ R9.3.23				
11	調布市立布田小学校校庭整備工事	校庭整備工事	68,508,000円	R8.6.10	(株)井上グラウンド施設工事	30%	10%	
				R8.6.11 ～ R8.10.30				
12	調布市立緑ヶ丘小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	24,530,000円	R8.6.15	(株)葉月商会	0%	0%	
				R8.6.16 ～ R9.3.18				
13	調布市立第三中学校給水設備改修工事	給水直結化工事	48,510,000円	R8.6.17	(株)あかつき設備	2%	0%	
				R8.6.18 ～ R9.2.26				
14	調布市立神代中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	21,208,000円	R8.6.17	園部電設(株)	0%	0%	
				R8.6.18 ～ R9.3.18				
15	調布市立調布中学校普通教室改修工事	普通教室改修工事	68,970,000円	R8.6.22	(株)久保工務店	2%	0%	
				R8.6.23 ～ R9.3.18				
16	調布市立調和小学校体育館床改修工事	体育館床改修工事	9,625,000円	R8.6.23	(株)田邊工務店	60%	0%	
				R8.6.24 ～ R8.8.31				
17	調布市立第六中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	17,925,600円	R8.6.23	園部電設(株)	0%	0%	
				R8.6.24 ～ R9.3.18				
18	調布市立第八中学校普通教室改修工事	普通教室改修工事	47,410,000円	R8.6.29	(株)G-BANK	2%	0%	
				R8.6.30 ～ R9.2.5				
19	調布市立第七中学校普通教室改修工事	普通教室改修工事	37,290,000円	R8.7.1	(株)東京建設コンサルタント	2%	0%	
				R8.7.2 ～ R9.2.26				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		—
				工期		今回	前回	
20	調布市立八雲台小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	33,550,000円	R8.7.1	(株)三誠	0%	0%	
				R8.7.2～ R9.3.18				
21	調布市立滝坂小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	26,950,000円	R8.7.6	小林電気(株)	0%	0%	
				R8.7.7～ R9.3.18				
22	調布市立第三中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	61,303,300円	R8.7.6	いわき電工(株)本店	0%	0%	
				R8.7.7～ R9.3.18				
23	調布市立第一小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	33,550,000円	R8.7.8	(株)大東電設	0%	0%	
				R8.7.9～ R9.3.18				
24	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事	遺跡ガイダンス施設の新築工事	323,400,000円	R7.12.18	相互建設(株)	40%	32%	参考写真 No.5
				R7.12.19～ R8.12.11				
25	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築に伴う電気設備工事	遺跡ガイダンス施設の新築に伴う電気設備工事	44,968,000円	R7.12.18	(株)磯原電気	13%	12%	
				R7.12.19～ R8.12.11				
26	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築に伴う機械設備工事	遺跡ガイダンス施設の新築に伴う機械設備工事	53,625,000円	R7.12.18	宮沢設備工業(株)	9%	8%	
				R7.12.19～ R8.12.11				
27	調布市立図書館宮の下分館改築工事	図書館分館の改築工事	301,400,000円	R7.12.18	林建設(株)	52%	45%	参考写真 No.6
				R7.12.19～ R9.1.8				
28	調布市立図書館宮の下分館改築に伴う電気設備工事	図書館分館の改築に伴う電気設備工事	58,448,500円	R7.12.18	(株)磯原電気	17%	15%	
				R7.12.19～ R9.1.8				
29	調布市立図書館宮の下分館改築に伴う機械設備工事	図書館分館の改築に伴う機械設備工事	40,497,600円	R7.12.18	(株)あかつき設備	12%	10%	
				R7.12.19～ R9.1.8				



No.1

調布市立若葉小学校・第四中学校・


図書館若葉分館施設整備PFI事業

中学校校舎棟(写真左上)・地上3階床梁 施工状況

小学校校舎棟(写真左下)・地上3階床梁 施工状況

アリーナ棟(写真中央)・地上1階躯体 施工状況

図書館棟(写真右側)・基礎 施工状況

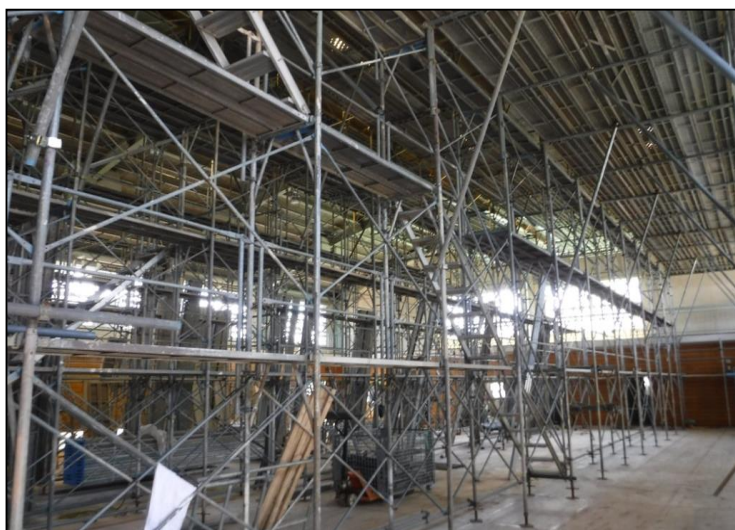

No.2

調布市立飛田給小学校体育館内部改修工事

内部仮設足場 設置状況



No.3

調布市立調布中学校体育館外部改修工事

外部仮設足場 設置状況



No.4
調布市立第二小学校給食室改修工事
外部仮設足場 設置状況



No.5
(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事
地上2階躯体 施工状況



No.6
調布市立図書館宮の下分館改築工事
地上1階躯体 施工状況
